




大 教 教 第 1 0 号  
平 成 26 年 4 月 17 日

文部科学大臣 殿

大田原市長 津久井 富雄



施設整備計画の事後評価について

学校施設環境改善交付金交付要綱第8の1に基づき、施設整備計画における事後評価の結果を報告します。

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	100.0	100.0
中学校	100.0	100.0
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

交付金事業を活用し、非木造構造の校舎・屋内運動場の耐震補強を全て実施することができた。  
なお、これからは、多くの学校が地震等の災害時に避難所としての役割を果たしていることから、天井材や窓ガラス・外壁等の落下防止など建物構造体以外の耐震化を図り防災機能の強化に努めていきたい。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="radio"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

<p>黒羽地区の中学校統廃合により廃校となった須賀川中学校を、小学生用に大規模改造し須賀川小学校として利活用することができ教育環境の向上を図ることができた。 また、学校のトイレの和式便器を洋式化し、トイレ空間を明るく清潔に改修することにより、トイレ環境の改善を図ることができた。 なお、様式便器が一般家庭にほぼ普及していることから、今後も計画的に洋式化を実施し教育環境の向上・改善を図っていきたい。</p>
---

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成26年4月、本市教育委員会内部において事後評価を実施した。その結果を、本市ホームページにて公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画に計画していた事業について、計画どおり実施することができた。  
また、次年度以降についても、喫緊の課題である非構造部材の耐震化、トイレ環境の向上・改善を優先的に実施し、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていきたい。なお、大田原地区の小学校再編整備計画の動向に合わせて、大田原小学校・紫塚小学校の校舎整備を計画的に実施していきたい。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 大田原市公立学校等施設整備計画

都道府県名	栃木県
市町村名	大田原市

2 計画作成主体 大田原市

3 計画期間 平成22年度～平成24年度

4 個別事業一覧

**※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。**

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
紫塚小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月16日				
親園小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年1月20日				
石上小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年1月20日				
寒井小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年11月16日				
佐良土小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年2月21日				
蛭田小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成23年2月21日				
大田原中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年12月24日				
大田原小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年1月20日				
湯津上小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年2月21日				
川西小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年2月21日				
須賀川中学校	③	0605	大規模改造(教育内容)	校	R	○	平成23年3月18日				
須賀川中学校	③	0605	大規模改造(教育内容)	屋	S	○	平成23年3月18日				
西原小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年12月27日				
薄葉小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、耐震強度が基準値を満たしていることが判明したため。	取下	平成23年6月2日	平成23年6月2日付け施設整備計画の変更により当該事業を取り下げ。
川西小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年1月18日				
両郷中央小学校	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年12月12日				
須賀川小学校	①	0502	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、耐震強度が基準値を満たしていることが判明したため。	取下	平成23年6月2日	平成23年6月2日付け施設整備計画の変更により当該事業を取り下げ。
両郷中央小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年2月17日				
金田南中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年3月15日				
野崎中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年2月2日				
佐久山中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年3月22日				
大田原小学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年1月18日				
西原小学校	①	0501	(特)地震補強	校	S	○	平成25年1月29日				
西原小学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年1月29日				
紫塚小学校	①	0501	(特)地震補強	校	S	○	平成24年10月1日				
親園小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年1月18日				
市野沢小学校	①	0501	地震補強	校	S	×		耐震診断の結果、耐震強度が基準値を満たしていることが判明したため。	取下	平成23年6月2日	平成23年6月2日付け施設整備計画の変更により当該事業を取り下げ。
市野沢小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年1月17日		追加	平成24年6月13日	平成24年6月13日付け施設整備計画の変更により当該事業を追加。
市野沢小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年1月17日				
奥沢小学校	①	0501	地震補強	屋	S	○	平成25年1月11日				
金丸小学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年1月31日				
羽田小学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	×		災害復旧事業へ切り替えたため。	取下	平成24年6月13日	平成23年6月2日付け施設整備計画の変更により当該事業を取り下げ。
薄葉小学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	○	平成25年1月17日				
大田原中学校	①	0501	(特)地震補強	校	S	○	平成24年12月5日				
大田原中学校	①	0501	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年12月5日				
湯津上中学校	①	0501	大規模改造(安全)	校		○	平成25年1月25日		追加	平成24年6月13日	平成24年6月13日付け施設整備計画の変更により当該事業を追加。
大田原中学校	①	0501	(特)地震補強	校	S				追加	平成24年6月13日	平成24年6月13日付け施設整備計画の変更により当該事業を追加。
						×		耐震診断の結果、耐震強度が基準値を満たしていることが判明したため。	取下	平成24年8月27日	平成24年8月27日付け施設整備計画の変更により当該事業を取り下げ。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 大田原市公立学校等施設整備計画

2 計画作成主体 大田原市

3 計画期間 平成22年度～平成24年度



4 個別事業一覧

都道府県名	栃木県
市町村名	大田原市

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
川西小学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成25年9月25日		追加	H25.2.26	平成25年2月26日付け施設整備計画の変更により当該事業を追加。
若草中学校	①	2201	防災機能強化	校		○	平成26年1月10日		追加	H25.2.26	
大田原小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年11月1日		追加	H25.2.26	
薄葉小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年11月1日		追加	H25.2.26	
川西小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年10月29日		追加	H25.2.26	
黒羽小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校		○	平成25年10月29日		追加	H25.2.26	


◎小中学校の耐震化率（昭和56年以前建築の非木造施設）

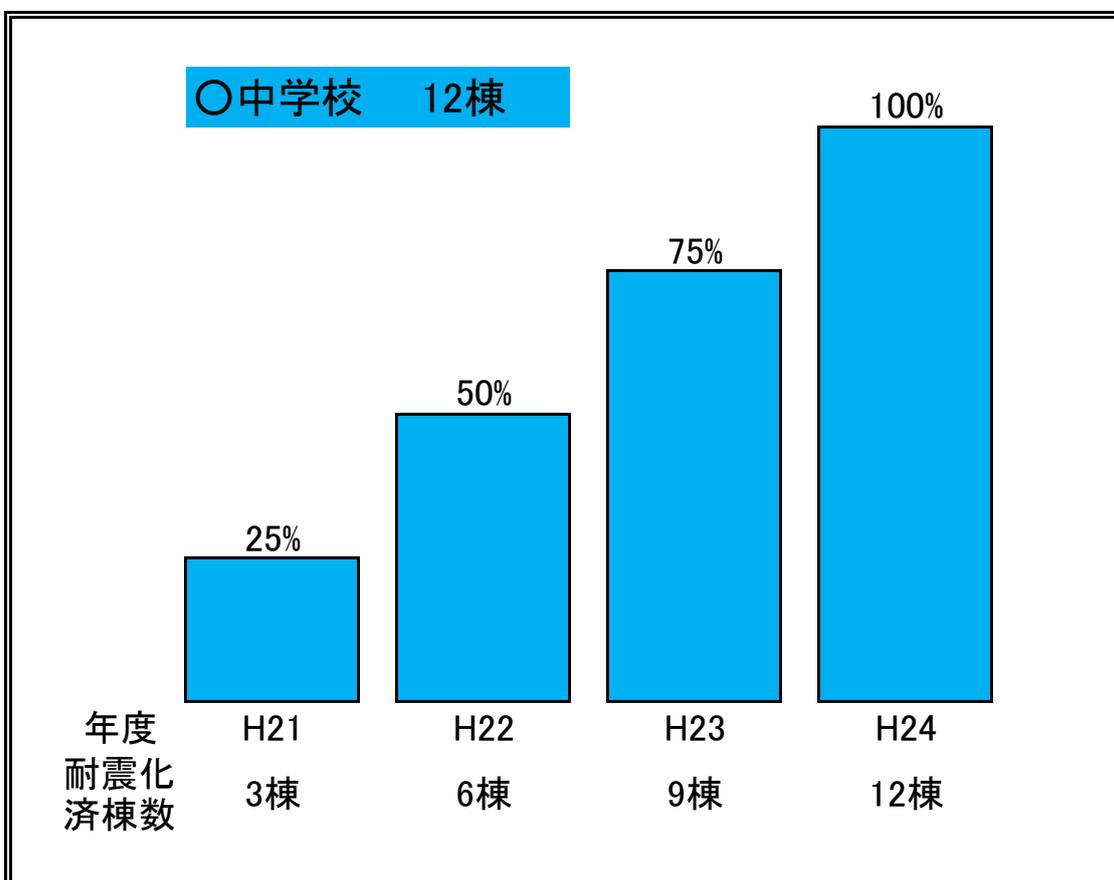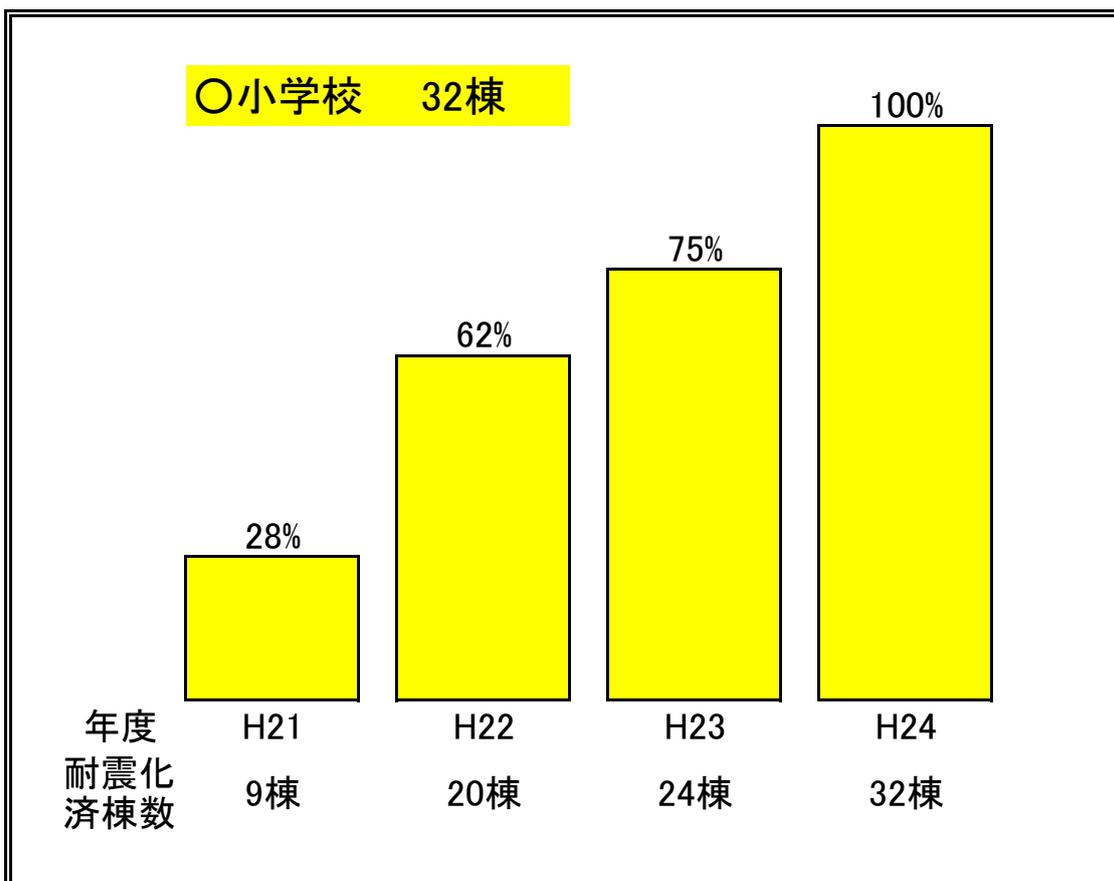

耐震改修着工前



耐震改修着工後

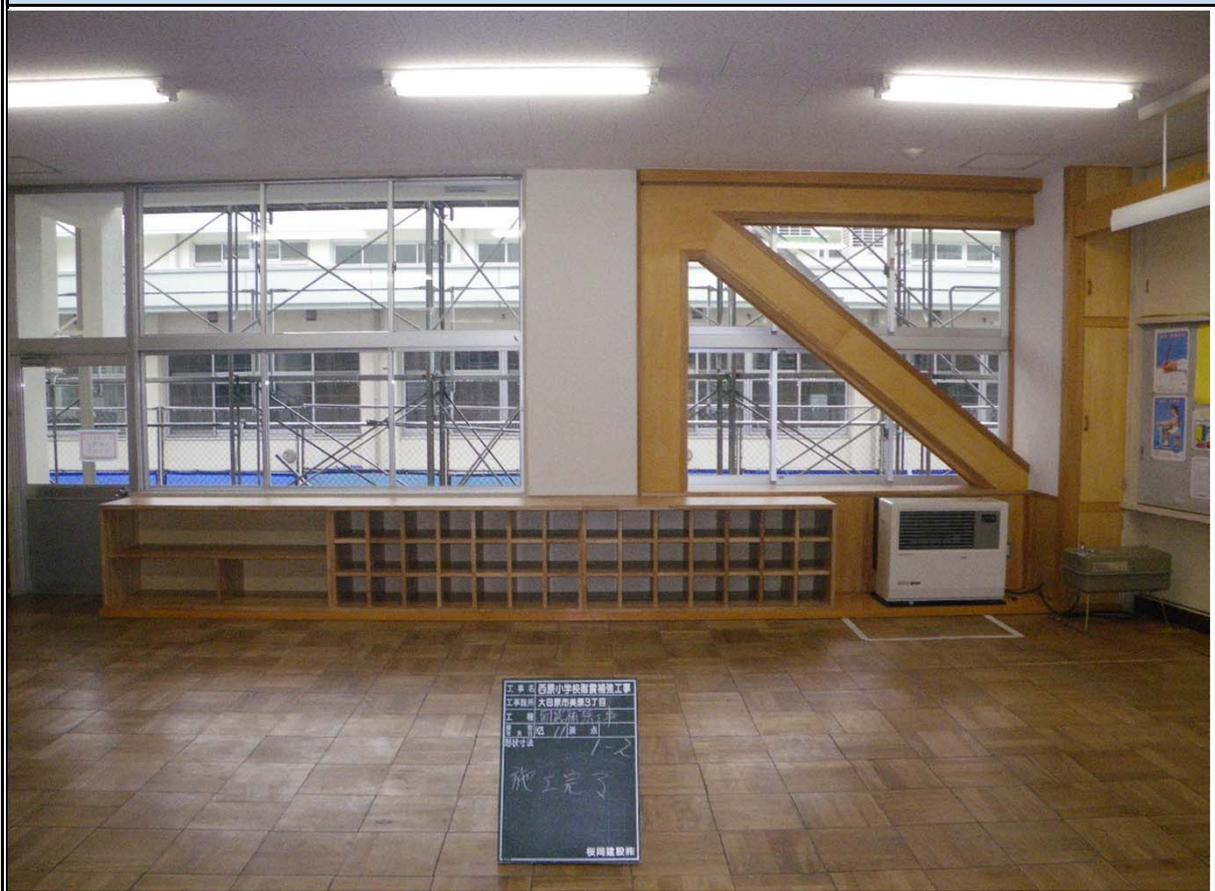

◎小中学校の校舎トイレ洋式化改修計画


学校トイレは、「汚い・くさい・暗い」の3Kなどと言われることがあり、特に既存校舎は老朽化が進む一方、改修が進まず取り残されている現状があります。

一般住宅や商業施設などのトイレ環境が向上し、また、洋式化が社会全体に普及していることから、学校トイレの改修は喫緊な課題と考えております。

大田原市は、これらを踏まえ、小中学校の校舎トイレ洋式化率50%以上を当初目標とし、次のとおりトイレ環境の改善を進めてまいります。

事業年度	25	26	27	28	29
事業実施校	大田原小	西原小	大田原中	若草中	市野沢小
(H26年度以降は 予定校であり、 財政状況により 変わることが あります。)	薄葉小	紫塚小	福原小	金田南中	金田北中
	川西小	金丸小		親園小	野崎中
	黒羽小	佐久山小		奥沢小	佐久山中
		湯津上小		羽田小	湯津上中
				石上小	親園中
				佐良土小	
				蛭田小	
				須賀川小	
				両郷中央小	

○整備後の実績及び目標値

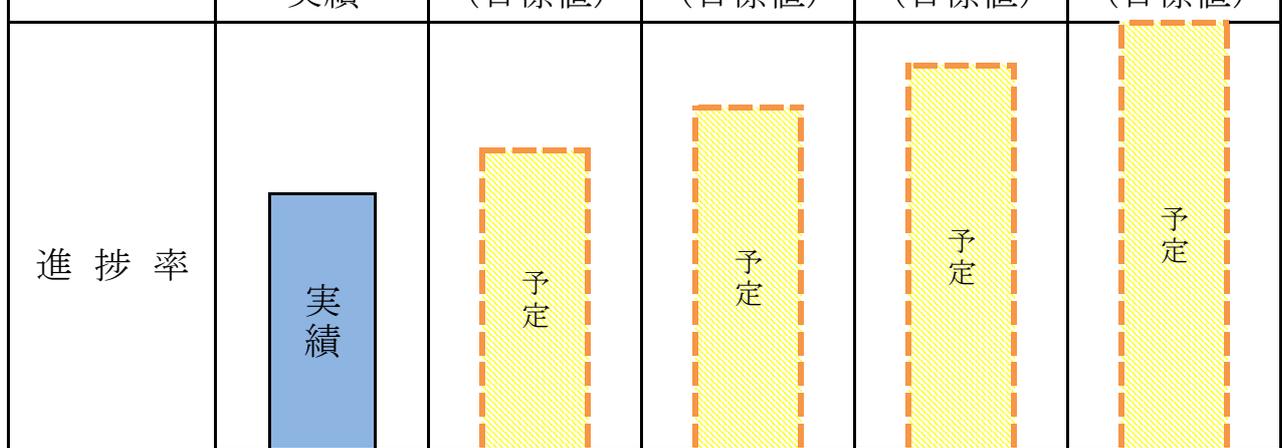事業年度	25	26	27	28	29
洋式化率	34%	40%	45%	51%	57%
	実績	(目標値)	(目標値)	(目標値)	(目標値)
進捗率					
	60%	70%	79%	89%	100%

トイレ改修着工前



トイレ改修着工後

